

2008년 군정주요업무
상반기 추진실적 및 하반기계획

건 설 과

목 차

I. 기본현황	3
II. '08년 비전과 전략목표 추진체계	4
III. 전략목표별 추진실적 및 하반기 계획	5
전략목표 1 건설행정의 원활한 추진	5
전략목표 2 미래지향적 도시개발을 통한 균형발전	7
전략목표 3 도로기반시설 확충으로 지역간 균형발전 기여 ...	10
전략목표 4 농업기반조성사업 추진으로 농업경쟁력 강화 ...	13
전략목표 5 주민과 함께하는 지역건설	16
IV. 특수시책	18
① 종합도로 안내표지판 설치	18
② 행정광고용 현수막게시대 확대설치 운영	19
③ 가로등고장 신고센터 홈페이지 운영	19
V. 주요 현안사업	20
① 보은~운암간 국도 확·포장 공사	20
② 보은~인포간 국도 확·포장 공사	21
③ 속리산연계도로 개설공사	22


I. 기본현황

1 주요기능

- 옥외광고물관리, 도로·하천 인허가, 댐주변지역사업 추진
- 군 기본계획수립, 개발행위허가
- 군도·농어촌도로 개설 및 유지관리
- 농업기반정비사업추진, 농촌마을·테마공원조성사업 추진
- 오지종합개발사업추진, 소규모주민숙원사업추진

2 기구 및 정원

- 5담당 - 정원 23명

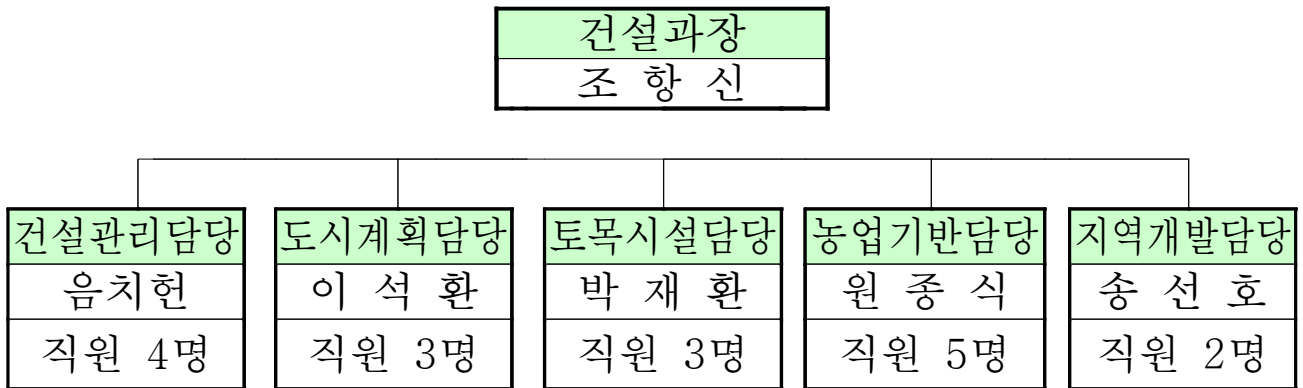

- 정·현원

(정원/현원)


계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
23	1	5	7	2	4	4
24	1	5	4(1)	7	2	4

※ 청원경찰 5명, 수로원 9명, (1)7급 1명 도청 파견

II. '08년 비전과 전략목표 추진체계

비
전

개발과 보전이 조화된
미래지향적 건설행정 추진



전략목표	건설행정의 원활한 추진	미래지향적 도시개발을 통한 균형발전	도로기반시설 확충으로 지역간 균형 발전기여	농업기반조성 사업추진으로 농업경쟁력강화	주민과 함께하는 지역건설
이 행 과 제	① 도시미관 정비 를 위한 광고물 관리 ② 주민지원사업 적극 추진	① 국토의 효율적 관리 ② 도시계획도로 개설로 도시 기반시설 확충 ③ 기반시설부담 금 부과 및 징수	① 군도 및 농어촌도로 개설 ② 신속한 도로 유지 보수로 이용자 편의 제공	① 농업생산기반 정비사업추진 ② 농촌마을 종합개발사업 추진 ③ 농업농촌 테마공원 조성사업추진	① 내실있는 지역균형발전 추진

Ⅲ. 전략목표별 추진실적 및 하반기 계획

1. 건설행정의 원활한 추진

이행과제 1-1 도시미관 정비를 위한 광고물 관리

주
성
과
지
표

▶ 현수막게시대 확대 설치 : 47개소('07) ⇨ 57개소('08)

□ 추진실적

① 현수막 게시대 확대 설치로 민원불편 해소

- 현수막 게시대 신규 및 교체설치 : 34개소 / 192,560천원
- 불법광고물의 지속적인 정비 : 월 2회
- 광고물(고정식, 유동식) 실명제 실시 : 6월부터

② 현수막 게시대 위탁방안 추진

- 타 지자체 우수사례 검토 : 2008. 2월
- 관련법령 검토 : 2008. 2월

□ 향후계획

① 현수막 게시대 확대 설치로 민원불편 해소

- 광고물(고정식, 유동식) 실명제 지속 실시

② 현수막 게시대 위탁방안 추진

- 광고협회와 위탁방안 추진 : 7월중

2. 미래지향적 지역개발을 통한 균형발전

이행과제 2-1 국토의 효율적 관리

주 요 성과 지표

- ▶ 군 관리계획(용도지역 변경 및 세분) 수립
- 농업진흥구역이 해제된 5.09km²를 농림지역<관리지역 변경
- ▶ 장기미집행 특별회계를 운영하여 도시계획시설부지 내 편입 대지에 대하여 보상

□ 추진실적

① 군 관리계획(용도지역 변경 및 세분) 수립

- 농업진흥구역에서 해제된 5.09km² 관리지역 세분화 용역 : 2008. 1월

② 장기미집행 특별회계 운영

- 장기미집행 토지 매수청구 접수 : 3건(심사중)

③ 국토의 체계적 관리를 위한 개발행위 허가 운영

- 주민편의 제공을 위한 개발행위허가 기준 정립
 - 영농목적 절성토 개발행위 완화 및 관련서류 간소화 : 2008. 4월
 - 불법행위(개발행위 등)의 사전차단을 위한 홍보 : 6회
 - 개발행위 허가 및 협의 처리 : 131건

□ 향후계획

① 군 관리계획(용도지역 변경 및 세분) 수립

- 농업진흥구역에서 해제된 5.09km² 관리지역 세분화 용역
 - 충청북도 도시관리계획 변경 결정 신청 : 2008. 12월한

② 장기미집행 특별회계 운영

- 10년이상 장기미집행 토지(대지) 매수청구시 보상 실시

③ 국토의 체계적 관리를 위한 개발행위 허가 운영

- 주민편의 제공을 위한 개발행위허가 기준 정립
 - 지속적인 인허가 서류 간소화 및 불법 개발행위 사전 차단

이행과제 2-2 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충

주성과지표

▶ 도시계획도로 개설사업 : 5건 / 6,105백만원('08)

□ 추진실적

① 운동장 진입도로 개설공사

- 사업개요
 - 사업량 : 도로 L= 940m, 교량 L=124m
 - 사업비 : 11,967백만원
- 용지보상 및 실시설계 완료
- 전체 공사 중 교량을 제외한 진입도로 공사완료 : 2008. 6월

② 교사리 보건소 앞 도시계획도로 개설공사

- 사업개요
 - 사업량 : 도로 L= 264m
 - 사업비 : 600백만원
- 토공 및 구조물 완료 (60%)

③ 교사리 사리골 진입도로 개설공사의 2건

- 사업개요
 - 사업량 : 도로 L= 559m
 - 사업비 : 860백만원
- 실시설계 및 보상 완료, 공사 집행중(10%)

□ 향후계획

① 운동장 진입도로 개설공사

- 보청천교 사업비 8,000백만원 확보를 위한 국도비 지원요구

② 교사리 보건소 앞 도시계획도로 개설공사 완료 : 2008. 12월

③ 교사리 사리골 진입도로 개설공사의 2건 : 2008. 12월

이행과제 2-3 기반시설부담금 부과 및 징수

주 성 과 지 요 요

▶ 기반시설부담금 부과 : 50건 / 60백만원

□ 추진실적

① 기반시설부담금 특별회계 운영

- 부과 : 52건 / 140백만원
- 징수 : 45건 / 71백만원

□ 향후계획

① 기반시설부담금 특별회계 운영

- 기반시설부담금 폐지(2008.03.08.)에 따른 기 부과된 부담금에 대하여 징수조치
- 기반시설부담금의 도시계획도로 개설 사업비로 재원대체

3. 도로 기반시설 확충으로 지역간 균형발전 기여

이행과제 3-1 군도 및 농어촌도로 개설

주요성과지표

▶ 도로포장을 제고로 지역발전을 위한 기반시설 확충 : 7개 노선 3.7km/5,483백만원

□ 추진실적

① 군도 확·포장 사업(5개노선 2.4km/ 3,862백만원)

- 병원~용암간 : 0.5km/1,030백만원
 - 총사업계획 : 2.7km/6,000백만원(전체진도 30%)
 - 기 투 자 : 0.5km/1,398백만원
 - 총사업기간 : 2007. 10. ~ 2010. 12.(4개년 계획)
- 기대~소여간 : 1.0km/1,013백만원
 - 총사업계획 : 3.5km/4,500백만원(전체진도 51%)
 - 기 투 자 : 1.0km/2,300백만원
 - 총사업기간 : 2005. 11. ~ 2010. 12.(6개년 계획)
- 갈전~범화간 : 0.2km/309백만원
 - 총사업계획 : 2.3km/3,500백만원(전체진도 14%)
 - 기 투 자 : 0.2km/500백만원
 - 총사업기간 : 2007. 11. ~ 2009. 12.(3개년 계획)
- 애곡~갈티간 : 0.3km/510백만원
 - 총사업계획 : 0.8km/1,500백만원(전체진도 33%)
 - 기 투 자 : 0.2km/500백만원
 - 총사업기간 : 2007. 11. ~ 2008. 12.(2년 계획)

- 북암 도로 확포장 : 0.4km/1,000백만원
 - 총사업계획 : 0.92km/1,000백만원(전체진도 51%)
 - 기 투 자 : 2008년 착공
 - 총사업기간 : 2008. 2. ~ 2009. 2.(1개년 계획)

② 농어촌도로 확·포장사업(2개 노선 1.3km/1,621백만원)

- 수문~갈평간 : 0.5km/ 710백만원
 - 총사업계획 : 3.4km/ 4,000백만원(전체진도 87%)
 - 기 투 자 : 2.9km/ 3,491백만원
 - 총사업기간 :2004. 7. ~ 2008. 12.(5개년 계획)

- 학림~종곡간 : 0.8km/911백만원
 - 총사업계획 : 3.4km/ 4,600백만원(전체진도 87%)
 - 기 투 자 : 1.5km/2,854백만원
 - 총사업기간 : 2005. 6. ~ 2009. 9.(4개년 계획)

이행과제 3-2 신속한 도로유지보수로 이용자 편의 제공

주 성 과 지 표	▶ 신속한 도로유지보수로 이용자 편의 및 쾌적한 도로 환경 제공 : 7종 사업 / 1,080백만원
----------------------------------	--

추진실적

① 군도 및 농어촌도로 유지관리

- 대 상 : 7종 사업 / 1,090백만원
 - 군도 25개 노선 / 107km
 - 농어촌도로 177개 노선 / 205km

- ① 고승리 위험도로 개선 사업 : 0.8km / 320백만원
 - 추진실적 : 고승리 위험도로 개선사업 시행중
- ② 유지관리 및 보수공사 : 8개소 / 69백만원
- ③ 안전시설물 및 표지판 정비 : 75개소 / 56백만원
- ④ 차선도색 및 덧씌우기 : 16개소 / 78백만원
- ⑤ 교량 유지보수 : 1개소 / 27백만원
- ⑥ 속리터널 유지관리 용역 : 200백만원

○ 도로이용불편신고 센터 운영

- 홈페이지 배너 게시 운영
- 접수창구 개선
- 이용불편신고 표지판 설치 운영 및 신고접수 : 15 건

□ **향후계획**

- 유지관리 및 보수공사 : 20개소 / 150백만원
- 안전시설물 및 표지판 정비 : 30개소 / 180백만원
- 차선도색 및 덧씌우기 : 5개소 / 30백만원
- 교량 유지보수 : 10개소 / 23백만원
- 응급복구 : 5개소 / 30백만원

4. 농업생산기반조성사업 추진으로 농업경쟁력 강화

이행과제 4-1

농업생산기반 정비사업 추진

주
요
성
과
지
표

- ▶ 농업생산기반정비사업:7건/8,124백만원('07)⇨7건/7,126백만원('08)
- ▶ 농업기반시설 유지관리:5건/162백만원('07)⇨3건/ 284백만원('08)

□ 추진실적

① 안정적 영농활동 지원을 위한 농업생산기반 정비사업

- 기계화 경작로포장사업 : 15개소 / 24.5km / 2,548백만원
 - 위 치 : 이평지구외 14개지구
 - 설계완료 : 2008년 06월
- 한발대비 농업용수 개발사업 : 1개소/100백만원
 - 사업착공(암반관정개발 1공) : 2008년 06월
- 부수지구 받기반정비사업 : 42ha /1,005백만원
 - 2007년 11월 공사 착수
 - 추진현황(현공정 : 90%)
농로포장(2,993m), 용수로(11,808m), 저수조(3개소), 암반관정(3개소)
- 정주기반확충사업 : 2개면(탄부면, 삼승면) / 1,449백만원
 - 설계완료 : 2008년 06월
- 농업기반시설(보) 개보수사업 : 1개소/200백만원
 - 사업완료(관기들보) : 2008년 06월
- 경지정리 지구내 수논 개선사업 : 25개소 / 209백만원
 - 사업완료 : 2008년 04월

- 소규모 농업기반정비사업 : 보은군 일원 / 1,615백만원
 - 추진실적 : 완료 14건 / 1,515백만원
 - 공사중지 1건 / 100백만원

② 농업기반시설 유지관리

- 사업내용 : 관정양수장 유지관리 외 2건 / 284백만원
 - 관정양수장 유지관리, 지하수영향조사, 농업기반시설정비사업(풀사업)
- 추진실적
 - 관정양수장 유지관리 보수 : 5개소
 - 농업기반시설정비사업 : 12개소

□ 향후계획

① 안정적 영농활동 지원을 위한 농업생산기반 정비사업

- 기계화 경작로포장사업 : 15개소 / 24.5km / 2,548백만원
 - 2008. 7. ~ 2008. 12 : 사업추진
- 부수지구 받기반정비사업 : 42ha / 1,005백만원
 - 2008. 7. ~ 2008. 11. : 잔디블럭 및 칼라아스콘 포장 등)
- 정주기반확충사업 : 2개면(탄부면, 삼승면) / 1,449백만원
 - 2008. 7. ~ 2008. 12 : 사업추진

② 농업기반시설 유지관리

- 유지관리 : 관정양수장 유지관리 외 2건 / 284백만원
 - 관정·양수장 보수 추진
 - 지하수 영향조사(7개소) : 농번기 완료 후 추진

이행과제 4-2

농촌마을 종합개발사업 추진

주요
성과지표

- ▶ 농촌마을종합개발사업 추진 : 장안면(5개리) 6,199백만원('08/2,042백만원)
- ▶ 농촌마을종합개발사업 대상권역 신청 : 종곡권역, 부수권역

□ 추진실적

① 농촌마을 종합개발사업 추진으로 주민들의 삶의 질 향상

- 위 치 : 보은군 장안면 서원권역(서원,봉비,장내1.2,개안)
- 총사업비 : 6,199백만원(2008년 : 2,042백만원)
- 사업기간 : 2007년 ~ 2011년(5년간)
- 사업량 : 생활환경정비외 4개분야
 - 쉼터정비, 마을회관정비, 다목적주차장, 방문객센터, 친환경공동축사
- 추진실적 : 세부계획 충청북도 승인, 사업착수

□ 향후계획

- 2009년 12월 : 1단계 사업완료

이행과제 4-3

농업농촌테마공원 조성사업 추진

주요
성과지표

- ▶ 농업농촌테마공원조성사업 추진 :산외면(2개리)5,000백만원('08/300백만원)

□ 추진실적

① 농업농촌테마공원 조성사업 추진으로 도·농 교류촉진 및 지역경제 활성화 도모

- 위 치 : 보은군 산외면 산대지구(산대1, 2리)
- 총사업비 : 5,000백만원(2008년 사업비 : 300백만원)

- 사업기간 : 2008년~2011년(4년간)
- 사업량 : 보은황토대추의 길, 보은황토체험의 길,
보은미니어처 공원 등
- 추진실적 : 충청북도 기본계획 승인

□ 향후계획

- ① 농업농촌테마공원 조성사업 추진으로 도·농 교류촉진 및 지역경제 활성화 도모
 - 2008년 12월 : 실시설계완료
 - 2009년 01월 : 년도별 사업추진

5. 주민과 함께하는 지역건설

이행과제 5-1 내실있는 지역균형발전 추진

주요성과지표

- ▶ 오지종합개발사업 추진 : 6건('07) ⇨ 8건('08)
- ▶ 지역개발사업 추진 : 43건('07) ⇨ 45건('08)

□ 추진실적

① 오지종합개발사업 추진

- 구병리 마을진입로 확포장공사외 7건/1,928백만원 : 설계완료

② 원활한 지역개발사업 추진

- 상판리 농로포장공사외 14건/1,487백만원 : 공사완료

□ 향후계획

① 오지종합개발사업 추진

- 농촌생활환경정비 평가 대비 신속한 사업추진 : 7월
- 사업 추진에 따른 지역 주민의 정주 의욕 고취

② 원활한 지역개발사업 추진

- 하반기(7월) 사업 착수 : 30건/2,695백만원
- 사업의 효과 및 시급성을 고려하여 사업추진
- 지역안배를 통한 지역균형발전을 도모

IV. 특수시책

1 종합안내표지판 설치

- 현재 공용청사나 복지시설 등 다중이 이용하는 시설에 대한 도로 안내 표지판이 산발적으로 설치되어 있거나 미설치 되어 있어, 이용객에게 혼란을 주고 있음.
- 우리군의 진출입 주요도로에 우리군의 이미지를 알릴 수 있는 종합 도로 안내표지판을 설치하여 도로 이용객 편의 제공

사업개요

- 사업량 : 안내표지판 설치 4개소
- 장소 : 군청사거리 전, 춘수골삼거리, 보은고삼거리, 후평사거리
- 사업비 : 150백만원
- 사업기간 : 2008. 4. ~ 2008. 9.

추진실적

- '08. 3 : 안내표지판 설치대상지 조사 및 타지자체 벤치마킹
- '08. 4 : 종합안내표지판 실시설계 용역 발주
- '08. 6 : 종합안내표지판 디자인 확정 및 실시설계 완료

향후계획

- '08. 7 : 관련기관 협의
- '08. 8 : 종합안내표지판 설치사업 집행
- '08. 10 : 설치완료

2 행정광고용 현수막게시대 확대 설치 운영

사업개요

- 사업량 : 12개소
- 사업비 : 40백만원
- 사업기간 : '08. 3. ~ 5.

추진실적

- 2008. 6 : 13개소 설치완료(보은읍 11개소, 수한면 2개소)

향후계획

- 2009년 읍·면 행정홍보용 게시대 11개소 설치

3 가로등 고장신고센타 홈페이지 운영

사업개요

- 군내 가로등 설치등수 : 총 4,753등
 - 농촌가로등 : 4,372등
 - 도시가로등 : 381등

추진실적

- 군 홈페이지 배너방 설치·운영
- 주민 신고체계 구축 : 각읍·면별로 이장 또는 인근 거주자
- 현재까지 고장 신고접수 : 320건 【수리완료(농촌가로등)】

향후계획

- 가로등 고장신고사항의 효율적 접수처리를 위한 홈페이지 운영·관리

V. 주요 현안사업

1 보은~운암간 국도 확·포장 공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 1996. ~ 2010. (15개년 계획)
- 사업량 : L=19.9km
- 총사업비 : 2,443억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 온빛건설 외 6개사

□ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2008년	향후		
계	2개소	19.9	2,443	1,729	200	514	68	
보은~내북간	보은 금굴 ~ 내북 봉황	16.4	1,810	1,453	100	257	88	온빛건설 외 2개
내북~운암간	내북 봉황 ~ 미원 운암	3.5	633	276	100	257	49	갑을건설 외 3개

- 2008년 구간별 공사계획

- 보은~내북간 : 안전시설, 포장공, 보은IC접속도로⇒56%
- 내북~운암간 : 교량슬라브, 지반보강, 포장공⇒ 28%

□ 향후계획

- 2008. 12월 : 미원~운암간 기본설계용역 납품예정 (761백만원)
- 2010. 12월 : 준공예정

2

보은~인포간 국도 확·포장공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. ~ 2013. (5개년 계획)
- 사업량 : L=23.2km
- 위치 : 옥천군 군북면 소정리~보은군 보은읍 강신리
- 총사업비 : 3,915억원(공사비 3,662억원, 보상비 253억원)
- 시행청 : 대전지방국토관리청

□ 추진실적

- 실시설계용역 완료 : '06. 12. 24
 - 「문티터널」 구간 우선 착공 국토해양부 건의 : '07. 5. 2
 - 「문티터널」 구간 우선 착공토록 청와대 비서실 건의 : '07. 9.11
- ※ 2009년 선보상 대상사업으로 확정

□ 향후계획

- 2009년 선 보상 실시
- 사업예산 확보로 조기착공을 위한 관련부처와의 협의

3 속리산연계도로 개설공사

□ 사업개요

- 사업량 : 도로 확포장 L=500m, 터널 1개소 L=500m
- 총사업비 : 124억원
- 관련기관 : 건설방재본부 건설정책팀

□ 추진실적

- '08. 1. : 사업계획 검토
- '08. 3. : 속리산 연계도로 개설공사 타당성조사 및 기본 계획 용역 실시
- '08. 3. : 충청북도 건설방재본부 건설정책팀에 용역보고서 제출 및 사업시행 건의
- '08. 5~6월 : 충청북도 도지사 방문시 사업시행 건의(2회)

□ 향후계획

- '08. 6~ : 사업이 조기에 시행될 수 있도록 관련기관과 지속적으로 건의하여 조기사행 되도록 하겠음.
